

















































Id	Nome	Trabalho	Custo	Duração	Início	Término	Sucessoras
1	<b>Gerenciamento do Projeto</b>	<b>324 hrs</b>	<b>R\$34,080...</b>	<b>197 dias</b>	<b>Qui 23/3/17</b>	<b>Sex 22/12/17</b>	
2	Elaborar Termo de Abertura	8 hrs	R\$960.00	1 dia	Qui 23/3/17	Qui 23/3/17	4
3	<b>Planejamento</b>	<b>120 hrs</b>	<b>R\$9,600.00</b>	<b>6 dias</b>	<b>Sex 24/3/17</b>	<b>Sex 31/3/17</b>	
4	Elaborar Plano de Gerenciamento de Escopo	20 hrs	R\$1,600.00	1 dia	Sex 24/3/17	Sex 24/3/17	5,7,8,9,11,12
5	Elaborar Plano de Gerenciamento de Tempo	14 hrs	R\$1,120.00	1.75 dias	Seg 27/3/17	Ter 28/3/17	6
6	Elaborar Plano de Gerenciamento de Custos	12 hrs	R\$960.00	1.5 dias	Ter 28/3/17	Qui 30/3/17	12
7	Elaborar Plano de Gerenciamento de Qualidade	12 hrs	R\$960.00	1.5 dias	Seg 27/3/17	Ter 28/3/17	11
8	Elaborar Plano de Gerenciamento de RH	8 hrs	R\$640.00	1 dia	Seg 27/3/17	Seg 27/3/17	9
9	Elaborar Plano de Gerenciamento de Stakeholders	12 hrs	R\$960.00	1.5 dias	Ter 28/3/17	Qua 29/3/17	10,11
10	Elaborar Plano de Gerenciamento de Comunicações	8 hrs	R\$640.00	1 dia	Qua 29/3/17	Qui 30/3/17	
11	Elaborar Plano de Gerenciamento de Riscos	20 hrs	R\$1,600.00	1 dia	Qua 29/3/17	Qui 30/3/17	
12	Elaborar Plano de Gerenciamento de Aquisições	14 hrs	R\$1,120.00	1.75 dias	Qui 30/3/17	Sex 31/3/17	
13	Monitorar e Controlar o Projeto	160 hrs	R\$19,200....	90 dias	Qui 23/3/17	Qua 26/7/17	
14	Registrar Lições Aprendidas	12 hrs	R\$1,440.00	2 dias	Ter 19/12/17	Qua 20/12/17	
15	Encerrar o Projeto	24 hrs	R\$2,880.00	4 dias	Ter 19/12/17	Sex 22/12/17	
16	<b>Aquisições</b>	<b>96 hrs</b>	<b>R\$8,000.00</b>	<b>42 dias</b>	<b>Qui 23/3/17</b>	<b>Sex 19/5/17</b>	
17	Realizar análise fazer x comprar	16 hrs	R\$1,280.00	2 dias	Qui 23/3/17	Sex 24/3/17	18
18	Especificar critérios de contratação	12 hrs	R\$960.00	2 dias	Seg 27/3/17	Ter 28/3/17	19
19	Elaborar o orçamento	24 hrs	R\$1,920.00	4 dias	Qua 29/3/17	Seg 3/4/17	20
20	Validar o orçamento	8 hrs	R\$960.00	1 dia	Ter 4/4/17	Ter 4/4/17	21
21	Contratar fornecedores	36 hrs	R\$2,880.00	5 dias	Seg 15/5/17	Sex 19/5/17	32,34,35,39,41,

Crítica		Etapa externa	
Divisão Crítica		Tarefa Inativa	
Tarefa		Etapa Inativa	
Divisão		Resumo Inativo	
Etapa		Tarefa Manual	
Margem de Atraso		Somente duração	
Adiamento		Acúmulo de Resumo Manual	
Resumo		Resumo Manual	
Resumo do projeto		Somente início	
Crítica Acumulada		Somente término	
Divisão Crítica Acumulada		Data limite	
Tarefas externas		Andamento	
























Id	Nome	Trabalho	Custo	Duração	Início	Término	Sucessoras
22	<b>Autorizações e Certificados</b>	<b>0 hrs</b>	<b>R\$17,040...</b>	<b>155 dias</b>	<b>Seg 3/4/17</b>	<b>Sex 3/11/17</b>	
23	Criar Startup	0 hrs	R\$2,000.00	30 dias	Seg 3/4/17	Sex 12/5/17	24,21,25
24	Registrar Domínio	0 hrs	R\$40.00	1 dia	Seg 15/5/17	Seg 15/5/17	27,28
25	Obter Certificação CMMI	0 hrs	R\$15,000....	120 dias	Seg 22/5/17	Sex 3/11/17	68,69
26	<b>Infraestrutura</b>	<b>8 hrs</b>	<b>R\$1,179.00</b>	<b>5 dias</b>	<b>Ter 16/5/17</b>	<b>Seg 22/5/17</b>	
27	Criar repositório na nuvem	4 hrs	R\$320.00	1 dia	Ter 16/5/17	Ter 16/5/17	
28	Especificar servidores de homologação da aplicação	4 hrs	R\$320.00	1 dia	Ter 16/5/17	Ter 16/5/17	
29	Hospedar Site	0 hrs	R\$539.00	1 dia	Seg 22/5/17	Seg 22/5/17	
30	<b>Arquitetura</b>	<b>264 hrs</b>	<b>R\$24,920...</b>	<b>23 dias</b>	<b>Seg 22/5/17</b>	<b>Qua 21/6/17</b>	
31	<b>iProjectWeb</b>	<b>148 hrs</b>	<b>R\$13,980...</b>	<b>18 dias</b>	<b>Seg 22/5/17</b>	<b>Qua 14/6/17</b>	
32	Mapear requisitos funcionais	56 hrs	R\$5,320.00	7 dias	Seg 22/5/17	Ter 30/5/17	33,40
33	Mapear requisitos não funcionais	40 hrs	R\$3,800.00	5 dias	Qua 31/5/17	Ter 6/6/17	36
34	Definir as cores	2 hrs	R\$150.00	1 dia	Seg 22/5/17	Seg 22/5/17	50
35	Definir as fontes	2 hrs	R\$150.00	1 dia	Seg 22/5/17	Seg 22/5/17	50
36	Prototipar as telas	16 hrs	R\$1,520.00	2 dias	Qua 7/6/17	Qui 8/6/17	37
37	Elaborar a documentação	32 hrs	R\$3,040.00	4 dias	Sex 9/6/17	Qua 14/6/17	46,51
38	<b>iProjectApp</b>	<b>92 hrs</b>	<b>R\$8,660.00</b>	<b>13 dias</b>	<b>Seg 22/5/17</b>	<b>Qua 7/6/17</b>	
39	Mapear requisitos funcionais	40 hrs	R\$3,800.00	5 dias	Seg 22/5/17	Sex 26/5/17	
40	Mapear requisitos não funcionais	24 hrs	R\$2,280.00	3 dias	Qua 31/5/17	Sex 2/6/17	43
41	Definir as cores	2 hrs	R\$150.00	1 dia	Seg 22/5/17	Seg 22/5/17	54
42	Definir as fontes	2 hrs	R\$150.00	1 dia	Seg 22/5/17	Seg 22/5/17	


	Crítica		Etapa externa	
	Divisão Crítica		Tarefa Inativa	
	Tarefa		Etapa Inativa	
	Divisão		Resumo Inativo	
	Etapa		Tarefa Manual	
	Margem de Atraso		Somente duração	
	Adiamento		Acúmulo de Resumo Manual	
	Resumo		Resumo Manual	
	Resumo do projeto		Somente início	
	Crítica Acumulada		Somente término	
	Divisão Crítica Acumulada		Data limite	
	Tarefas externas		Andamento	

Id	Nome	Trabalho	Custo	Duração	Início	Término	Sucessoras
43	Prototipar as telas	8 hrs	R\$760.00	1 dia	Seg 5/6/17	Seg 5/6/17	44
44	Elaborar a documentação	16 hrs	R\$1,520.00	2 dias	Ter 6/6/17	Qua 7/6/17	46,55,54
45	<b>Banco de Dados</b>	<b>24 hrs</b>	<b>R\$2,280.00</b>	<b>5 dias</b>	<b>Qui 15/6/17</b>	<b>Qua 21/6/17</b>	
46	Elaborar Diagrama ER	8 hrs	R\$760.00	2 dias	Qui 15/6/17	Sex 16/6/17	47
47	Criar Banco de Dados	16 hrs	R\$1,520.00	3 dias	Seg 19/6/17	Qua 21/6/17	
48	<b>Desenvolvimento</b>	<b>544 hrs</b>	<b>R\$50,400...</b>	<b>52 dias</b>	<b>Ter 23/5/17</b>	<b>Qua 2/8/17</b>	
49	<b>iProjectWeb</b>	<b>320 hrs</b>	<b>R\$29,600...</b>	<b>52 dias</b>	<b>Ter 23/5/17</b>	<b>Qua 2/8/17</b>	
50	Elaborar Layout	40 hrs	R\$3,000.00	5 dias	Ter 23/5/17	Seg 29/5/17	59
51	Implementar Requisitos Funcionais	160 hrs	R\$15,200....	20 dias	Qui 15/6/17	Qua 12/7/17	52,60
52	Implementar Requisitos Não Funcionais	120 hrs	R\$11,400....	15 dias	Qui 13/7/17	Qua 2/8/17	61
53	<b>iProjectApp</b>	<b>224 hrs</b>	<b>R\$20,800...</b>	<b>25 dias</b>	<b>Qui 8/6/17</b>	<b>Qua 12/7/17</b>	
54	Elaborar Layout	24 hrs	R\$1,800.00	3 dias	Qui 8/6/17	Seg 12/6/17	63
55	Implementar Requisitos Funcionais	120 hrs	R\$11,400....	15 dias	Qui 8/6/17	Qua 28/6/17	56,64
56	Implementar Requisitos Não Funcionais	80 hrs	R\$7,600.00	10 dias	Qui 29/6/17	Qua 12/7/17	65
57	<b>Testes e Validações</b>	<b>116 hrs</b>	<b>R\$17,985...</b>	<b>61 dias</b>	<b>Ter 30/5/17</b>	<b>Ter 22/8/17</b>	
58	<b>Web</b>	<b>66 hrs</b>	<b>R\$5,360.00</b>	<b>50 dias</b>	<b>Ter 30/5/17</b>	<b>Seg 7/8/17</b>	
59	Aprovar layout	2 hrs	R\$240.00	1 dia	Ter 30/5/17	Ter 30/5/17	
60	Homologar requisitos funcionais	40 hrs	R\$3,200.00	5 dias	Qui 13/7/17	Qua 19/7/17	66
61	Homologar requisitos não funcionais	24 hrs	R\$1,920.00	3 dias	Qui 3/8/17	Seg 7/8/17	66,64,65
62	<b>Aplicativo</b>	<b>50 hrs</b>	<b>R\$4,080.00</b>	<b>44 dias</b>	<b>Ter 13/6/17</b>	<b>Sex 11/8/17</b>	
63	Aprovar layout	2 hrs	R\$240.00	1 dia	Ter 13/6/17	Ter 13/6/17	


Crítica		Etapa externa	
Divisão Crítica		Tarefa Inativa	
Tarefa		Etapa Inativa	
Divisão		Resumo Inativo	
Etapa		Tarefa Manual	
Margem de Atraso		Somente duração	
Adiamento		Acúmulo de Resumo Manual	
Resumo		Resumo Manual	
Resumo do projeto		Somente início	
Crítica Acumulada		Somente término	
Divisão Crítica Acumulada		Data limite	
Tarefas externas		Andamento	

Id	Nome	Trabalho	Custo	Duração	Início	Término	Sucessoras
64	Homologar requisitos funcionais	32 hrs	R\$2,560.00	4 dias	Ter 8/8/17	Sex 11/8/17	66
65	Homologar requisitos não funcionais	16 hrs	R\$1,280.00	2 dias	Ter 8/8/17	Qua 9/8/17	66
66	Realizar Auditoria de Segurança	0 hrs	R\$8,545.00	7 dias	Seg 14/8/17	Ter 22/8/17	
67	<b>Operação Assistida</b>	<b>244 hrs</b>	<b>R\$39,580...</b>	<b>31 dias</b>	<b>Seg 6/11/17</b>	<b>Seg 18/12/17</b>	
68	Publicar site	2 hrs	R\$190.00	0.25 dias	Seg 6/11/17	Seg 6/11/17	71,70
69	Disponibilizar aplicativo	2 hrs	R\$190.00	1 dia	Seg 6/11/17	Seg 6/11/17	71,70
70	Realizar Ações de Marketing	0 hrs	R\$20,000....	14 dias	Ter 7/11/17	Sex 24/11/17	
71	Monitorar acessos	240 hrs	R\$19,200....	30 dias	Ter 7/11/17	Seg 18/12/17	14,15



Crítica		Etapa externa	
Divisão Crítica		Tarefa Inativa	
Tarefa		Etapa Inativa	
Divisão		Resumo Inativo	
Etapa		Tarefa Manual	
Margem de Atraso		Somente duração	
Adiamento		Acúmulo de Resumo Manual	
Resumo		Resumo Manual	
Resumo do projeto		Somente início	
Crítica Acumulada		Somente término	
Divisão Crítica Acumulada		Data limite	
Tarefas externas		Andamento	

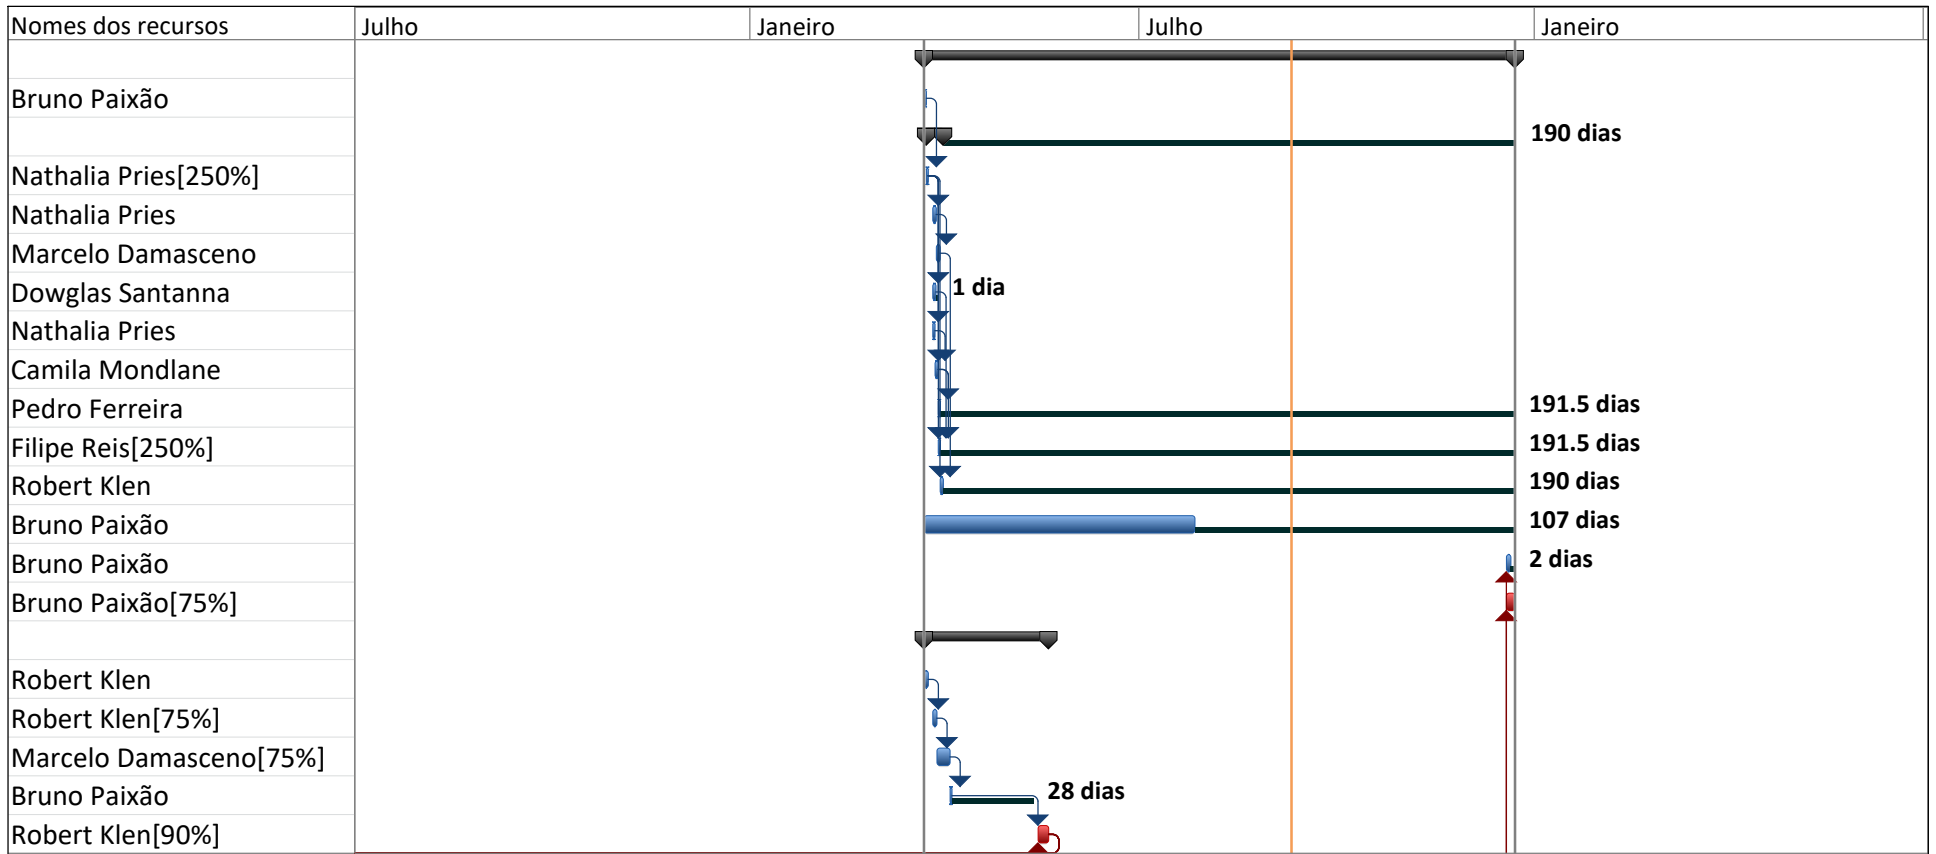


Crítica		Etapa externa	
Divisão Crítica		Tarefa Inativa	
Tarefa		Etapa Inativa	
Divisão		Resumo Inativo	
Etapa		Tarefa Manual	
Margem de Atraso		Somente duração	
Adiamento		Acúmulo de Resumo Manual	
Resumo		Resumo Manual	
Resumo do projeto		Somente início	
Crítica Acumulada		Somente término	
Divisão Crítica Acumulada		Data limite	
Tarefas externas		Andamento	

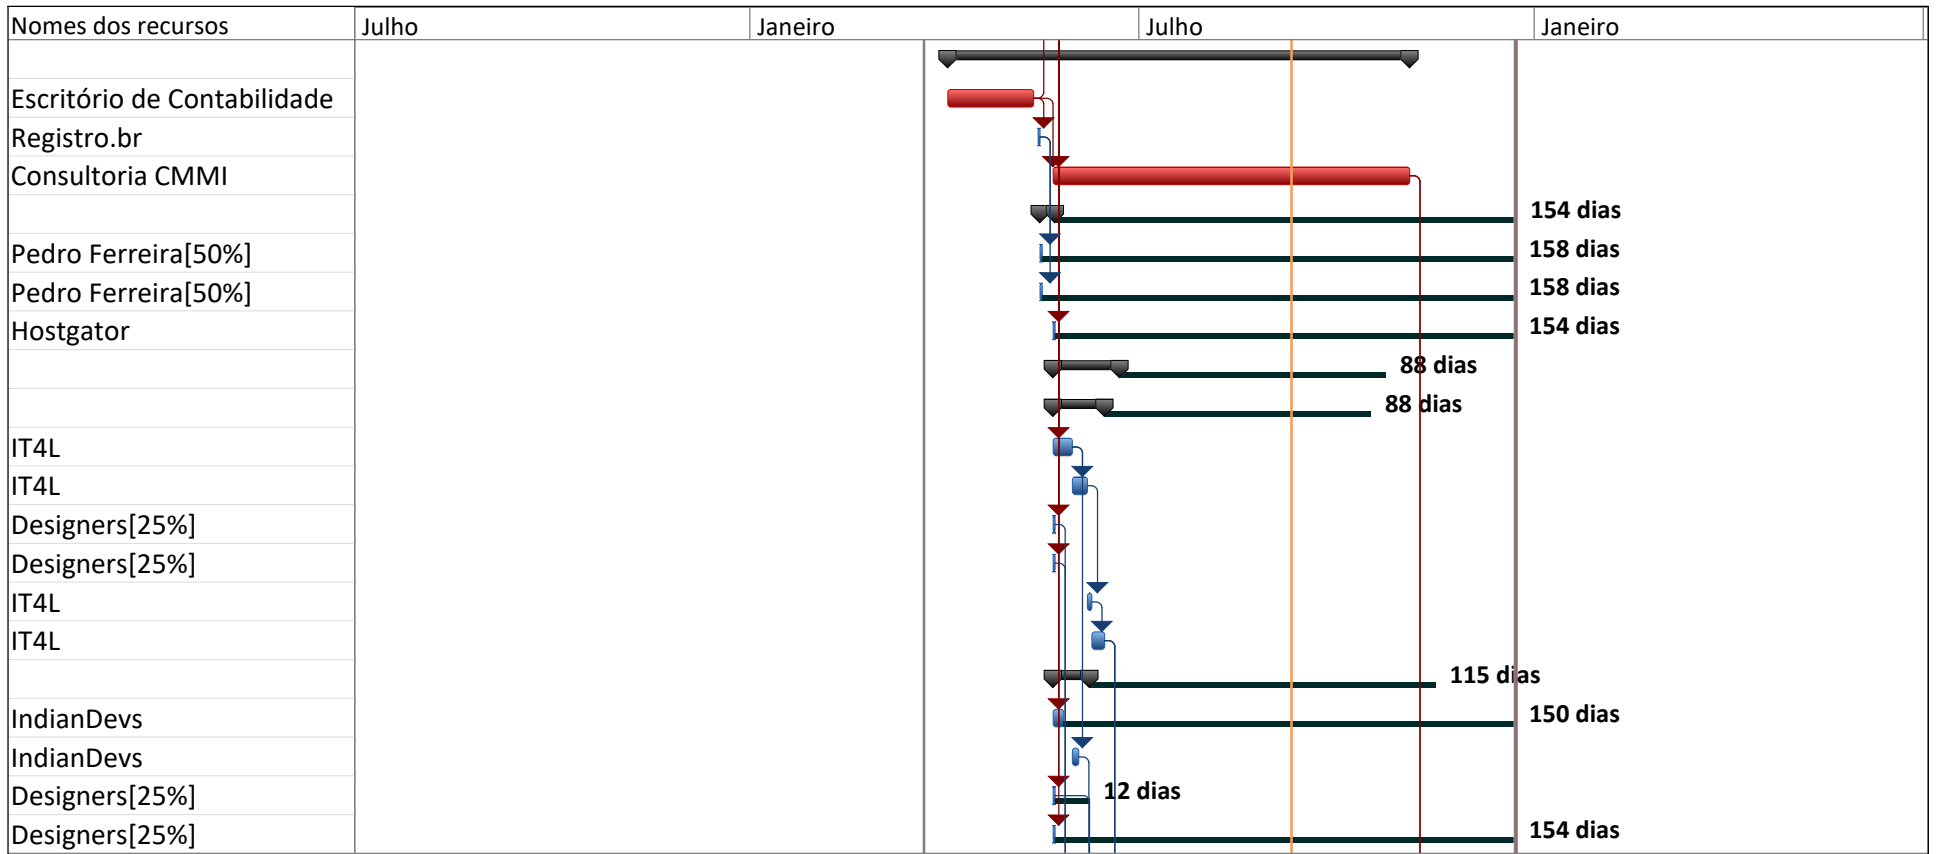

Crítica		Etapa externa	
Divisão Crítica		Tarefa Inativa	
Tarefa		Etapa Inativa	
Divisão		Resumo Inativo	
Etapa		Tarefa Manual	
Margem de Atraso		Somente duração	
Adiamento		Acúmulo de Resumo Manual	
Resumo		Resumo Manual	
Resumo do projeto		Somente início	
Crítica Acumulada		Somente término	
Divisão Crítica Acumulada		Data limite	
Tarefas externas		Andamento	

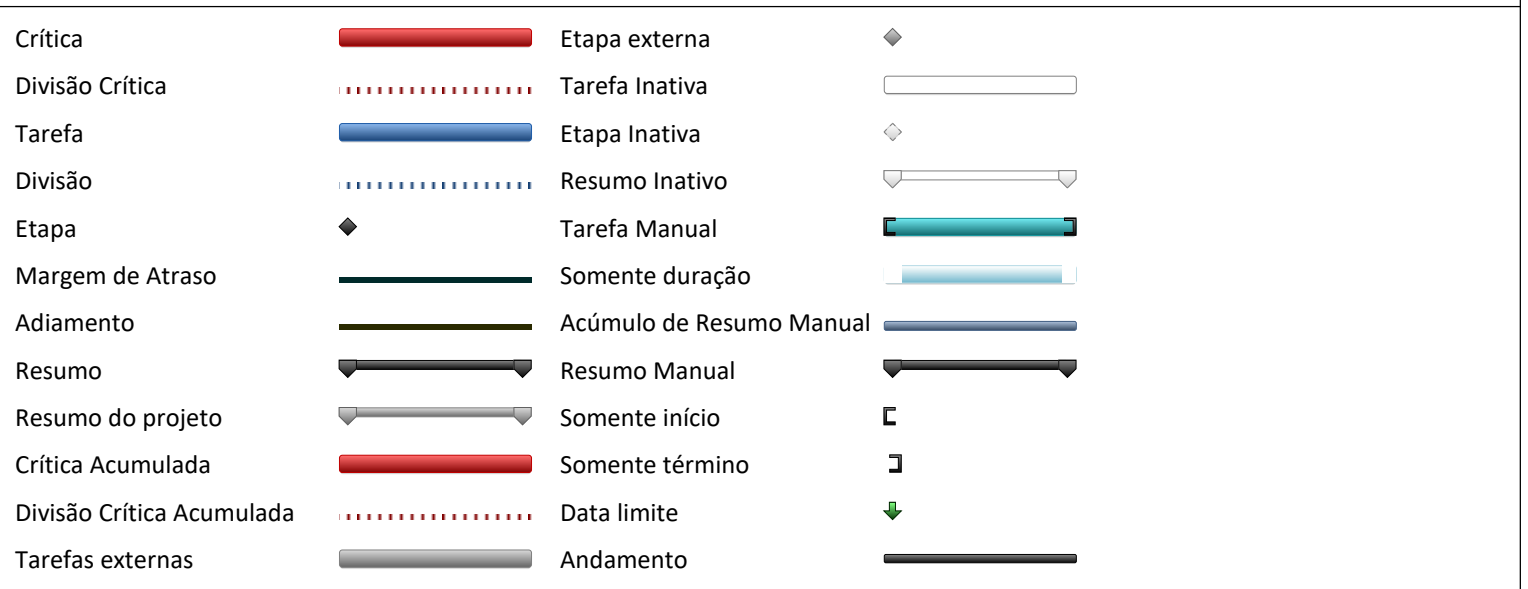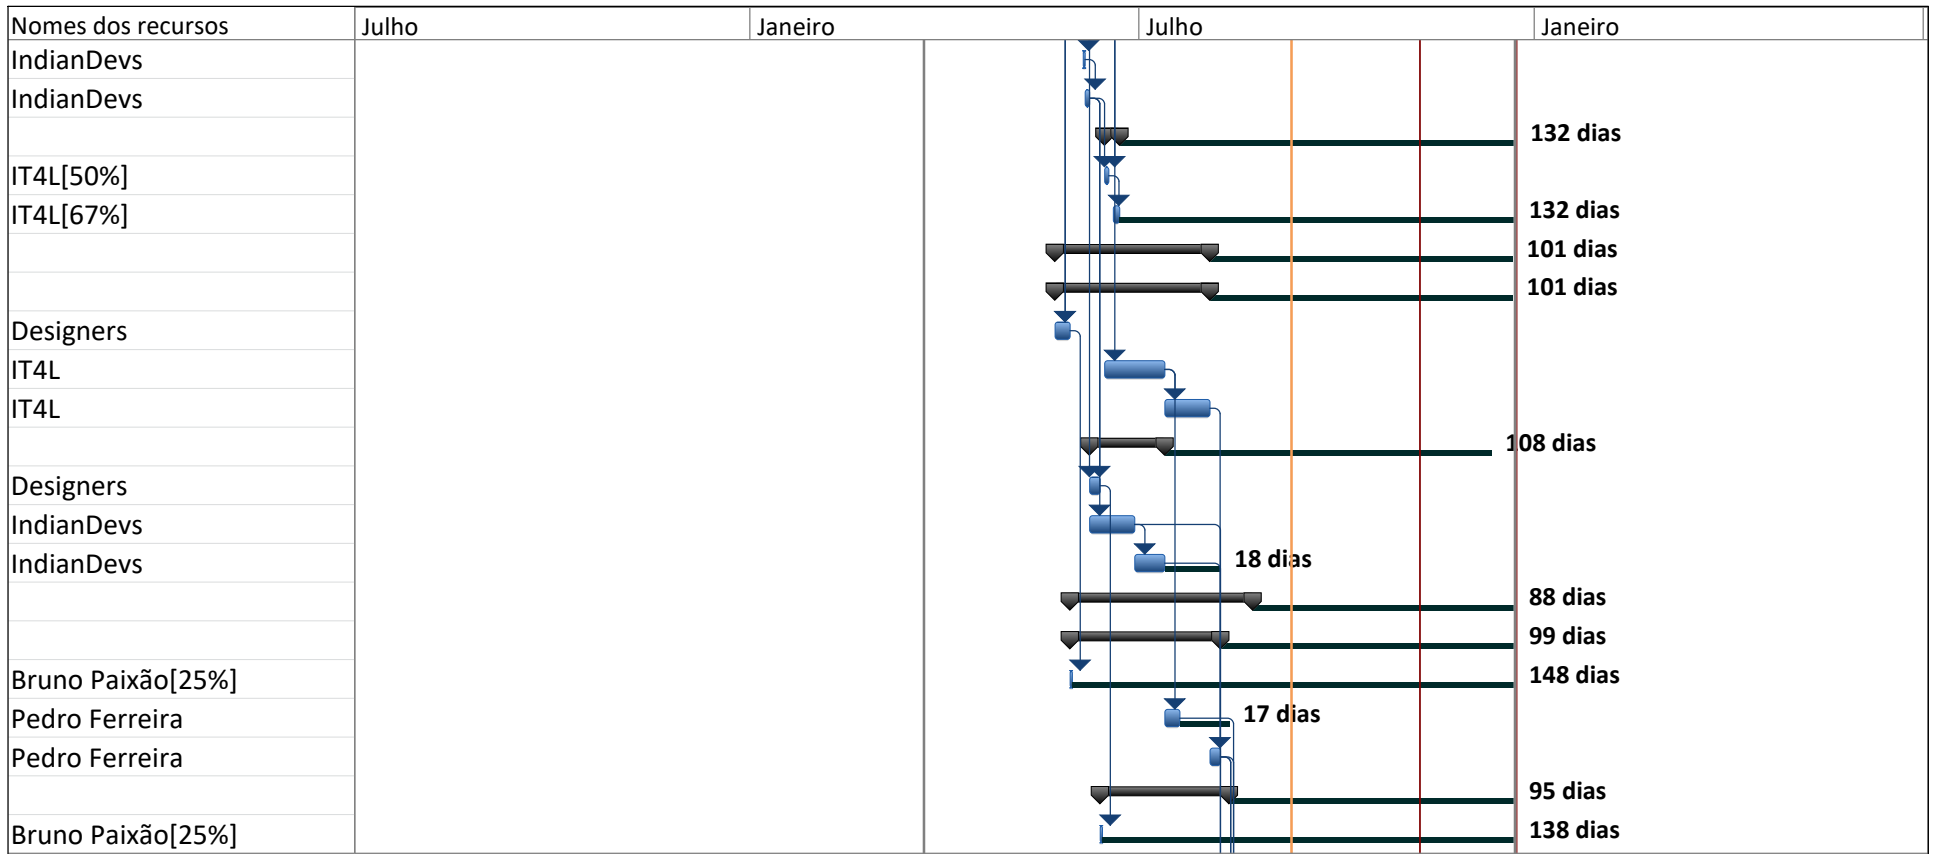

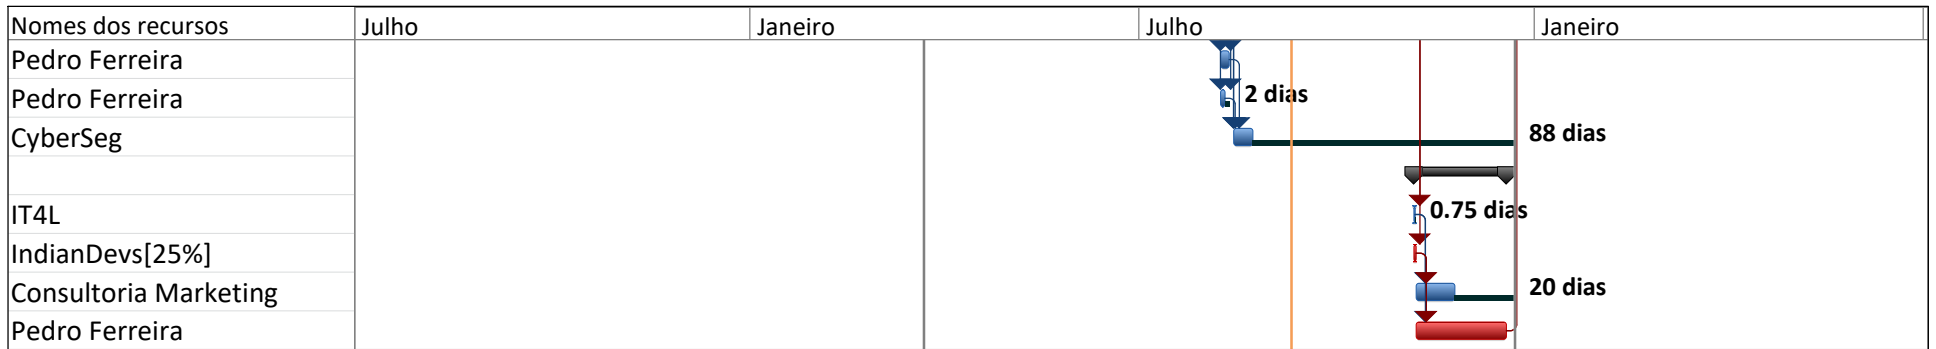

Crítica		Etapa externa	
Divisão Crítica		Tarefa Inativa	
Tarefa		Etapa Inativa	
Divisão		Resumo Inativo	
Etapa		Tarefa Manual	
Margem de Atraso		Somente duração	
Adiamento		Acúmulo de Resumo Manual	
Resumo		Resumo Manual	
Resumo do projeto		Somente início	
Crítica Acumulada		Somente término	
Divisão Crítica Acumulada		Data limite	
Tarefas externas		Andamento	
